

さいたま市立病院新病院工事概要

■工事概要

工事名称 : さいたま市立病院新病院建設工事

工期 : 2017年(平成29年)5月26日～2019年(令和元年)11月29日

設計・監理 : 株式会社 山下設計

施工 : 鹿島・斎藤工業・松永建設 特定共同企業体

■施設について

構造 : 病院本館:S+CFT造(免震構造)、別館:RC造、スロープ棟:RC造

階数 : 病院本館:地上10階建、別館:地上3階建、スロープ棟:地上2階建

最高高さ : 44.85 m (病院本館)


建築面積 : 9,012.39 m²(病院本館 6,907.94 m²、別館 1,113.04 m²、スロープ棟 991.41 m²)

延床面積 : 54,238.83 m²(病院本館 50,186.57 m²、別館 3,287.42 m²、スロープ棟 764.84 m²)

工事写真

2019.10.30 撮影

南側

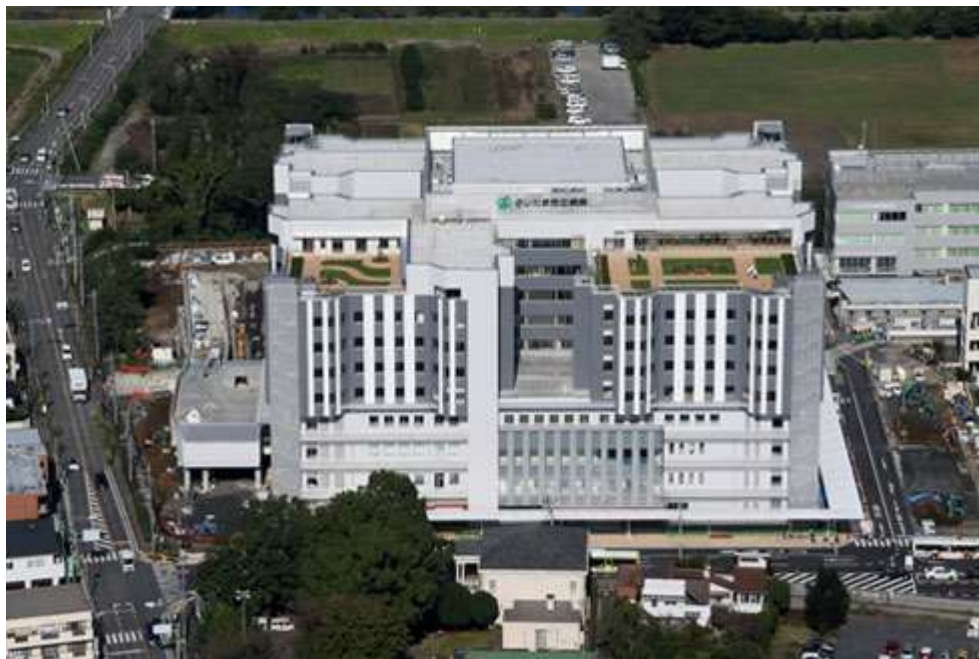

北側



病院本館、別館棟は部分引渡を行いました。(外構工事、サイン工事を除く)残りは一部外構工事、スロープ棟となりました。

南側



本館工事は引き続き各フロア内装・設備工事を施工しています。

北側



立体駐車場までの道路が完成しました。
スロープ棟はスロープが見えるようになりました。

南側



本館工事は引き続き各フロア内装・設備工事を施工しています。

北側



別館棟は内装工事を中心に施工しています。
スロープ棟は躯体工事を進めており、形が見えるようになりました。

南側



本館工事は各フロア内装・設備工事を中心に施工しています。

北側



別館棟は内装工事を中心に施工しています。
スロープ棟は地上躯体工事を進めております。

南側



外部足場の解体が終わり、全景が見えるようになりました。
屋上緑化工事の様子も見えます。

北側



別館棟は立体駐車場と同じ高さまで工事が進みました。
スロープ棟は掘削工事に着手しています。

南側



東側、南側の外構工事に着手しています。外部足場が少しずつ解体されてきました。

北側



別館及びスロープ棟の工事に着手しています。

南側



病院本館では外装工事及び各フロア内装工事を施工中です。
外構工事に着手しました。

北側



別館及びスロープ棟の工事に着手しています。

南側



病院本館の外壁・内装工事を施工中です。

北側



病院別館の地上躯体工事を施工中です。

2019.2.18 撮影



病院本館の外壁工事を施工中です。屋上階のコンクリート打設完了です。

2019.1.23 撮影



病院本館の外壁工事に着手しています。屋上階も着々と工事が進んでいます。

2018.12.22 撮影



病院本館の地上鉄骨第6節まで建方完了しました。柱溶接作業、付帯鉄骨工事に進んでまいります。

2018.11.21 撮影



病院本館の地上鉄骨第5節を建方中です。鉄骨の組み上がりまであと少しです。

2018.10.22 撮影



病院本館の地上鉄骨第3、4節を建方中です。建物の形が徐々に見えてきました。

2018.09.28 撮影



現在、病院本館の地上鉄骨第3節を建方中です。建物の形が徐々に見えてきました。

2018.08.27 撮影



病院本館は、地上鉄骨建方工事を開始しました。少しずつ建物の形が見えてきます。

2018.07.26 撮影



病院本館は、1階床のコンクリートを打設しています。まもなく地上鉄骨建方工事が始まります。

2018.06.22 撮影



病院本館は、基礎躯体部の鉄骨建方を完了してます。現在、1階床を工事中です。

2018.05.22 撮影



病院本館は、西工区より基礎部鉄骨工事を、東工区は免震装置設置及び擁壁工事を施工中です。

2018.04.21 撮影



病院本館は、基礎躯体工事を施工中。免震層のコンクリートを打設中です。

2018.03.26 撮影



資機材を揚重するため、大型のクレーンが2台設置されました。病院本館の基礎躯体工事を施工中です。

2018.02.21 撮影



病院本館及び別館棟は基礎躯体工事を施工中。残土の搬出も進み、工事用車両が増えてきました。

2018.1.29 撮影



病院本館、別館及びスロープ棟は、基礎躯体工事を施工中。構台も形が見えてきました。

2017.12.20 撮影



病院本館は土工事に着手、別館棟及びスロープ棟は基礎躯体工事を施工中です。

2017.11.28 撮影



病院本館は、杭工事の終盤を迎えています。
別館棟及びスロープ棟は土工事・基礎躯体工事に着手しています。

2017.10.26 撮影



病院本館、別館棟、スロープ棟ともに杭工事を施工中です。

2017.9.26 撮影



地盤改良工事に着手しています。大型重機が設置されました。

2017.8.25 撮影



既存建物の解体が終わり、新病院建設工事の準備工事が始まりました。
