


第5章 有効率向上対策

- 1 年間総給水量、年間総有効水量及び年間総有収水量推移図
- 2 修繕件数施工状況
- 3 漏水調査実施状況

1 年間総給水量、年間総有効水量及び年間総有収水量推移図

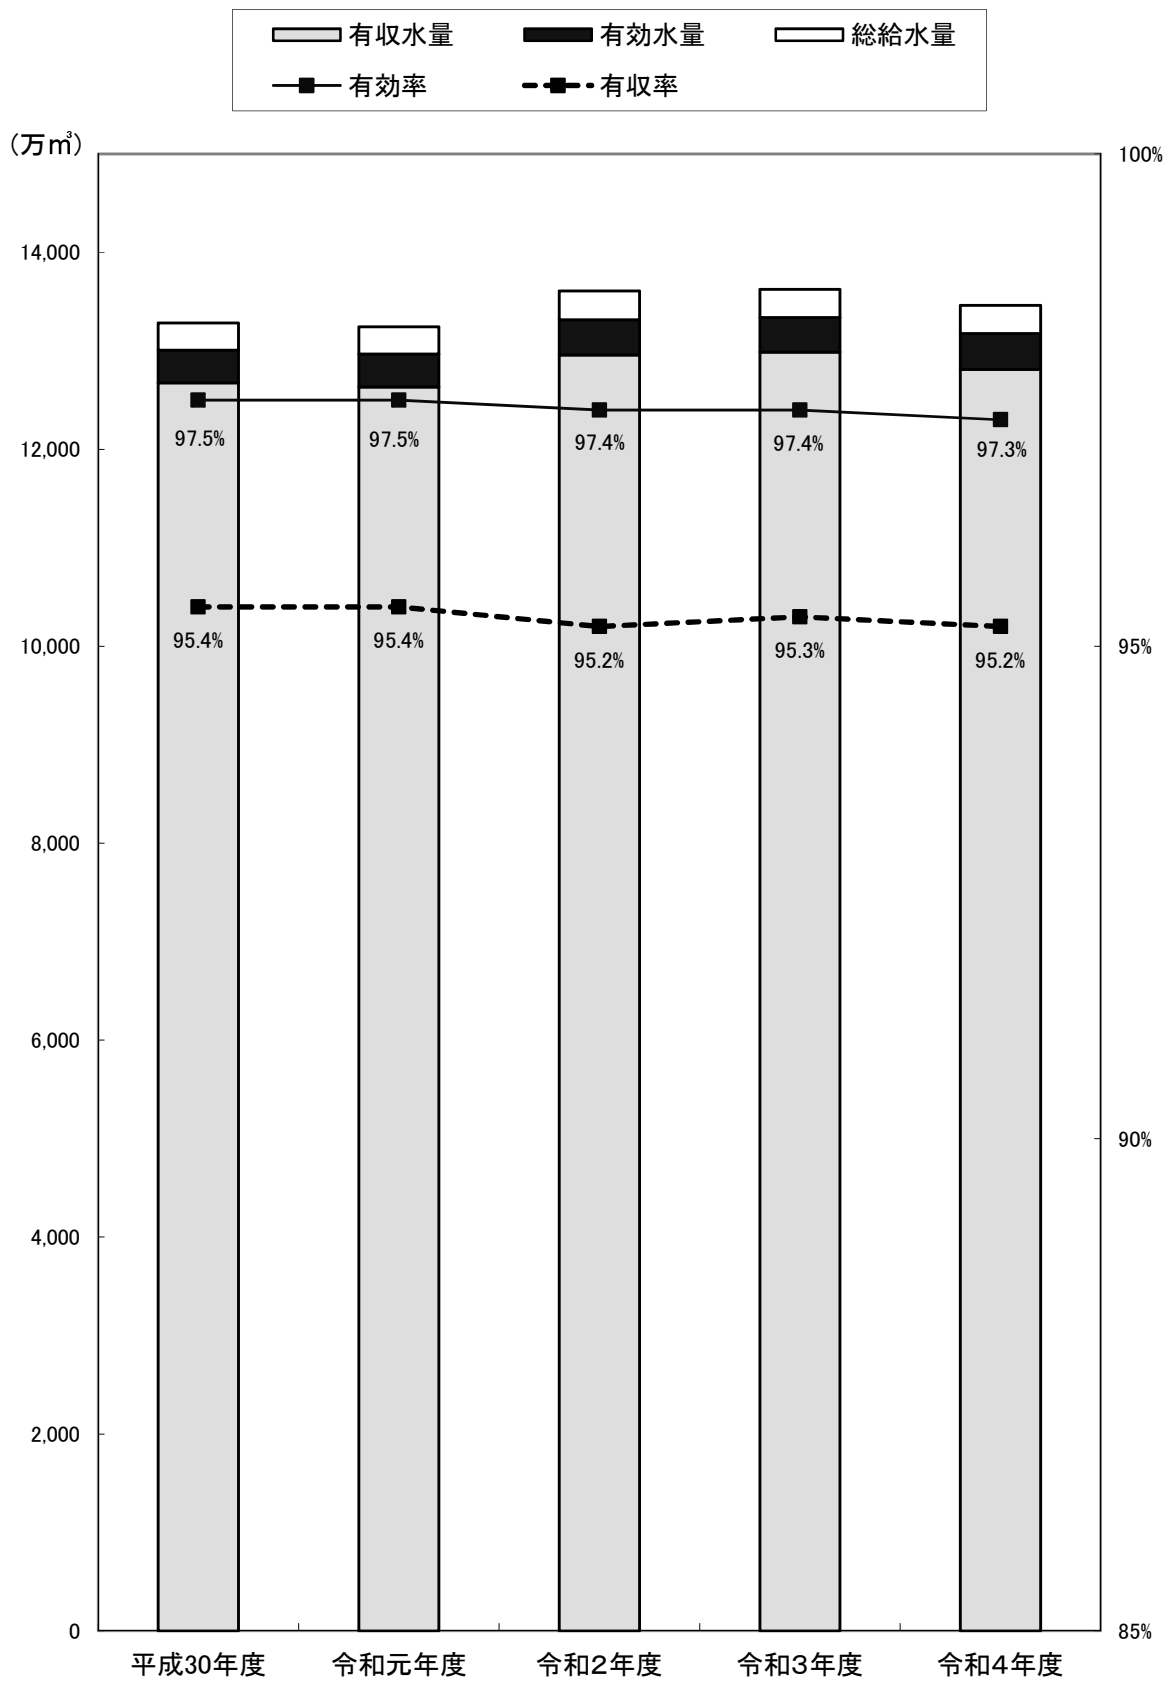

2 修繕件数施工状況

(1) 漏水修繕工事内訳

単位:件

事 項			直営			委託			合計			有 収 漏 水 量 (m ³)	有効無収 洗浄水量 (m ³)	漏水防止 推定水量 (m ³)
			有料	無料	計	有料	無料	計	有料	無料	計			
箇 所														
	漏 道 管	配 水 管	配 水 管	0	0	0	2	14	16	2	14	16	49.0	1.869
配 水 管 継 手			0	0	0	0	7	7	0	7	7	0.0	1.472	184.8
空 気 弁			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	0.0
仕 切 弁			0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0	0.000	0.0
消 火 栓			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	0.0
排 水 栓			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	0.0
小 計		0	0	0	3	21	24	3	21	24	49.0	3.341	1,000.8	
給 水 管		サドル付分水管	0	0	0	3	41	44	3	41	44	9.0	5.049	592.0
		止 水 栓	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0.0	0.981	57.8
		給 水 管	0	0	0	31	716	747	31	716	747	31.0	126.396	10,064.0
		給 水 管 継 手	0	0	0	2	159	161	2	159	161	3.0	29.003	2,322.2
		小 計	0	0	0	36	920	956	36	920	956	43.0	161.429	13,036.0
計		0	0	0	39	941	980	39	941	980	92.0	164.770	14,036.8	
宅 地 内		給 水 管	給 水 管	0	0	0	125	717	842	125	717	842	0.0	128.702
	給 水 管 継 手		0	0	0	20	250	270	20	250	270	0.0	39.790	4,796.6
	手 動 式 バ ル ブ		0	0	0	0	95	95	0	95	95	0.0	11.346	863.6
	メー ター 継 手		0	0	0	3	10	13	3	10	13	0.0	1.571	204.5
	バ ル ブ 類		0	0	0	1	57	58	1	57	58	0.0	9.158	909.8
	水 栓		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	0.0
計		0	0	0	149	1,129	1,278	149	1,129	1,278	0.0	190.567	24,779.3	
合 計			0	0	0	188	2,070	2,258	188	2,070	2,258	92.0	355.337	38,816.1

(2) その他工事内訳

単位:件

事 項			直営			委託			合計			有 収 洗浄水量 (m ³)	有効無収 洗浄水量 (m ³)
			有料	無料	計	有料	無料	計	有料	無料	計		
箇 所													
	そ の 他	切 回 し 移 設 工 事 整 備 工 事	配 水 管	0	0	0	37	129	166	37	129	166	530.0
給 水 管			0	0	0	1	14	15	1	14	15	0.0	0.0
空 気 弁			0	0	0	0	7	7	0	7	7	0.0	0.0
仕 切 弁			0	0	0	0	26	26	0	26	26	0.0	0.0
消 火 栓			1	0	1	65	0	65	66	0	66	0.0	0.0
他	調 査 排 水 そ の 他 の 工 事	排 水 栓	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0.0	0.0
		調 査	0	1,225	1,225	0	26	26	0	1,251	1,251	0.0	0.0
		排 水	0	14	14	0	1,439	1,439	0	1,453	1,453	0.0	3,848.2
		そ の 他 の 工 事	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0.0	0.0
合 計		1	1,239	1,240	103	1,955	2,058	104	3,194	3,298	530.0	4,020.2	
(1) + (2) 総 計			1	1,239	1,240	291	4,025	4,316	292	5,264	5,556	-----	-----

3 漏水調査実施状況

事項		年度	令和4年度		令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
			数量	比較増△減				
調査実施延長 (m)	直営調査	昼間調査	160,220	40,220	120,000	120,000	120,000	120,000
		夜間調査	0	0	0	0	0	0
		小計	160,220	40,220	120,000	120,000	120,000	120,000
	委託調査	昼間調査	824,110	28,870	795,240	1,136,520	1,172,440	1,241,725
		夜間調査	549,400	19,250	530,150	487,060	502,470	532,169
		小計	1,373,510	48,120	1,325,390	1,623,580	1,674,910	1,773,894
計		1,533,730	88,340	1,445,390	1,743,580	1,794,910	1,893,894	
漏水発見件数 (件)	道路配水管	8	1	7	8	1	3	
	道路給水管	103	△40	143	152	146	145	
	宅地内給水管	62	△7	69	94	126	210	
	計	173	△46	219	254	273	358	
漏水防止推定水量 (m ³ /日)	道路配水管	434	△15	449	151	26	81	
	道路給水管	1,396	△557	1,953	2,058	2,016	1,865	
	宅地内給水管	806	92	714	1,074	1,377	1,564	
	計	2,636	△480	3,116	3,283	3,419	3,510	
戸別調査件数(件)		131,405	△12,689	144,094	187,523	193,226	201,706	
