


## 第5章 有効率向上対策

- 1 年間総給水量、年間総有効水量及び年間総有収水量推移図
- 2 修繕件数施工状況
- 3 漏水調査実施状況

# 1 年間総給水量、年間総有効水量及び年間総有収水量推移図

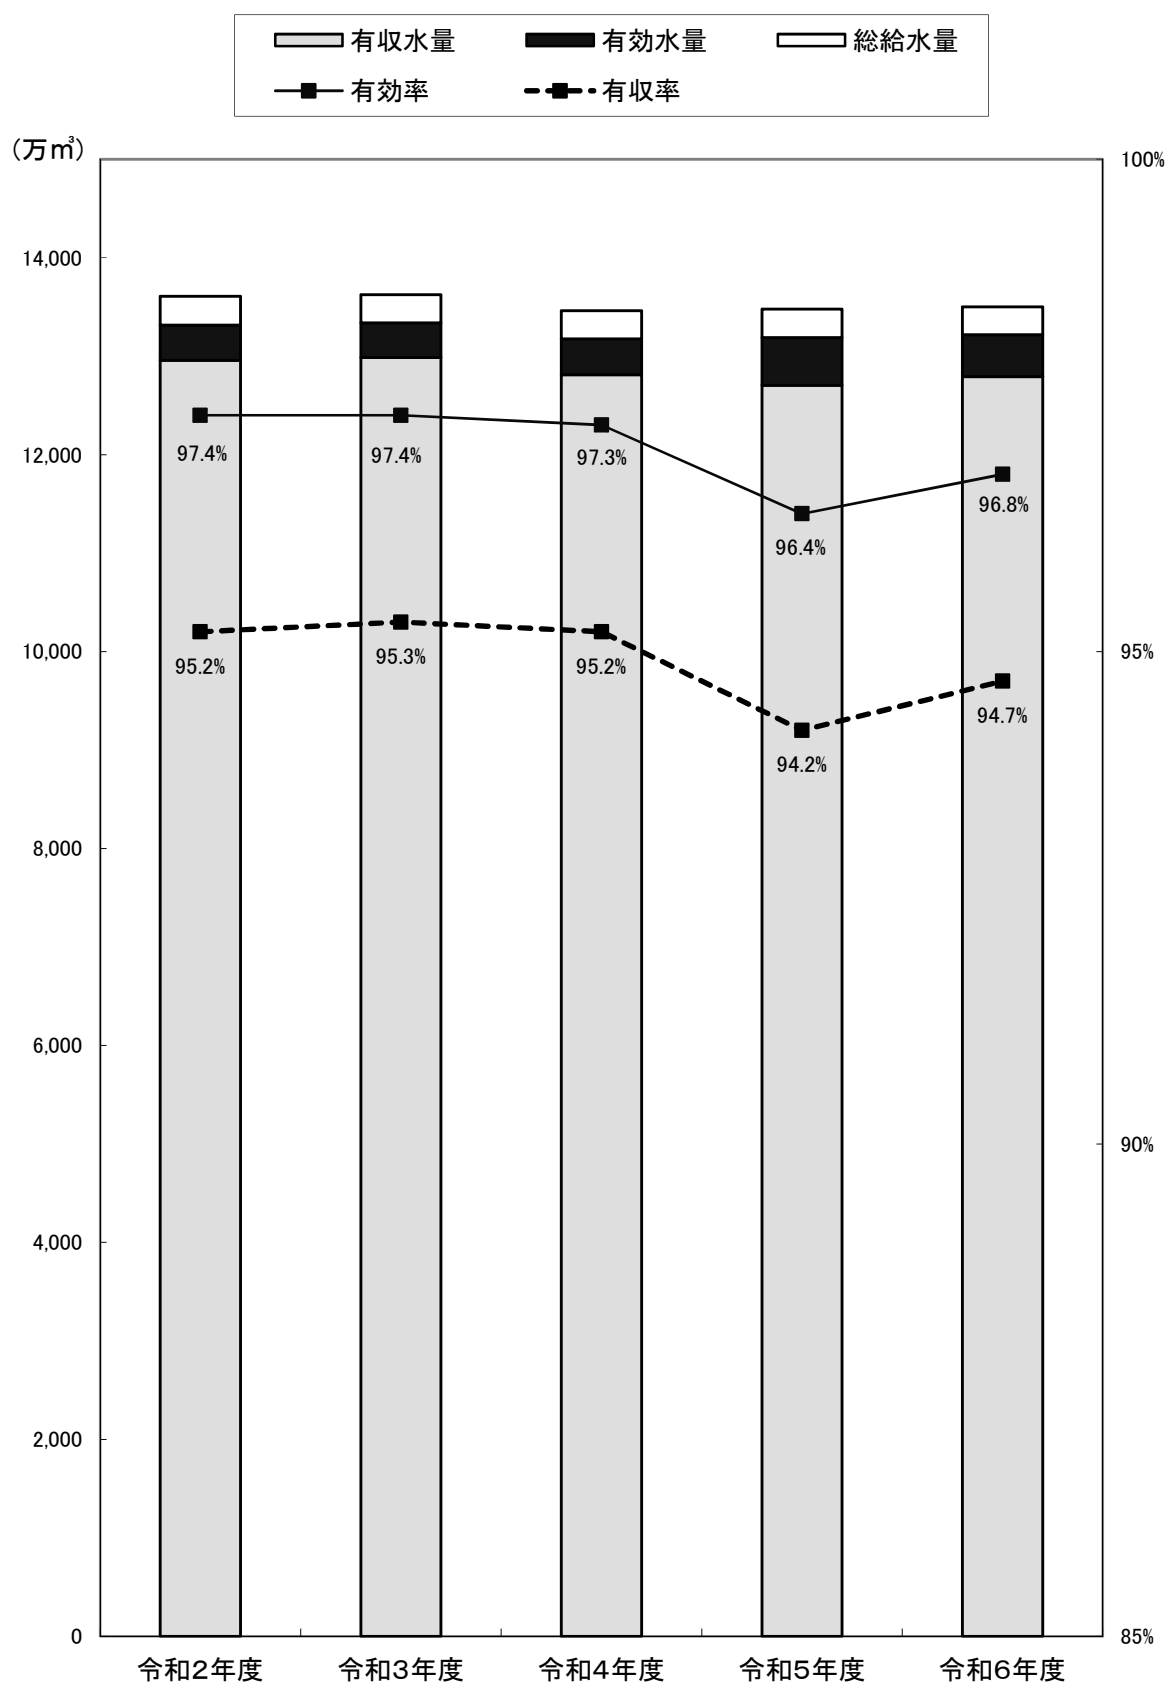

## 2 修繕件数施工状況

### (1) 漏水修繕工事内訳

単位:件

事 項 箇 所				直営			委託			合計			有 収	有効無収	漏水防止
				有料	無料	計	有料	無料	計	有料	無料	計	漏 水 量 (m³)	洗浄水量 (m³)	推定水量 (m³)
漏水修繕	道	水	配 水 管	0	0	0	1	10	11	1	10	11	28.0	7.160	530.4
			配 水 管 継 手	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0.0	9.227	237.6
			空 気 弁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	0.0
			仕 切 弁	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0.0	0.000	353.6
			消 火 栓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	0.0
			排 水 栓	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0.0	0.000	13.6
		小 計	0	0	0	1	23	24	1	23	24	28.0	16.387	1,135.2	
		路	サドル付分水栓	0	0	0	2	44	46	2	44	46	3.0	7.518	684.0
			止 水 栓	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0.0	0.460	37.4
			給 水 管	0	0	0	36	762	798	36	762	798	61.0	136.698	10,825.6
			給 水 管 継 手	0	0	0	2	174	176	2	174	176	2.0	29.293	2,526.2
			小 計	0	0	0	40	982	1,022	40	982	1,022	66.0	173.969	14,073.2
	計		0	0	0	41	1,005	1,046	41	1,005	1,046	94.0	190.356	15,208.4	
	宅 地 内	給 水 管	給 水 管	0	0	0	109	789	898	109	789	898	0.0	122.464	17,649.1
			給 水 管 継 手	0	0	0	12	241	253	12	241	253	0.0	40.654	3,738.1
			手動式バルブ	0	0	0	1	58	59	1	58	59	0.0	7.975	577.3
			メーター継手	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0.0	0.925	20.4
			バ ル ブ 類	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0.0	10.800	666.4
			水 栓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000	0.0
		計	0	0	0	122	1,138	1,260	122	1,138	1,260	0.0	182.818	22,651.3	
合 計		0	0	0	163	2,143	2,306	163	2,143	2,306	94.0	373.174	37,859.7		

### (2) その他工事内訳

単位:件

事 項  箇 所				直営			委託			合計			有 収	有効無収
				有料	無料	計	有料	無料	計	有料	無料	計	洗 浄 水 量 (m³)	洗 浄 水 量 (m³)
そ の 他	切 回 し 移設工事	配 水 管	0	0	0	44	86	130	44	86	130	759.0	656.0	
		給 水 管	0	0	0	15	8	23	15	8	23	0.0	0.0	
	整備工事	空 気 弁	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0.0	0.0	
		仕 切 弁	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0.0	0.0	
		消 火 栓	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0.0	0.0	
		排 水 栓	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0.0	0.0	
合 計	調 査		0	1,287	1,287	0	31	31	0	1,318	1,318	0.0	0.0	
	排 水		0	5	5	0	1,565	1,565	0	1,570	1,570	0.0	2,925.8	
	そ の 他 の 工 事		0	0	0	0	267	267	0	267	267	0.0	0.0	
	合 計		0	1,293	1,293	147	1,989	2,136	147	3,282	3,429	759.0	3,581.8	
(1) + (2) 総 計				0	1,293	1,293	310	4,132	4,442	310	5,425	5,735	-----	-----

### 3 漏水調査実施状況

年 度 事 項			令 和 6 年 度		令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
			数 量	比較増△減				
調 査 実 施 延 長 (m)	直 営 調 査	昼間調査	154,140	10,720	143,420	160,220	120,000	120,000
		夜間調査	0	0	0	0	0	0
		小 計	154,140	10,720	143,420	160,220	120,000	120,000
	委 託 調 査	昼間調査	812,330	△ 152,570	964,900	824,110	795,240	1,136,520
		夜間調査	541,550	128,030	413,520	549,400	530,150	487,060
		小 計	1,353,880	△ 24,540	1,378,420	1,373,510	1,325,390	1,623,580
	計		1,508,020	△ 13,820	1,521,840	1,533,730	1,445,390	1,743,580
漏 水 発 見 件 数 (件)	道 路 配 水 管		5	2	3	8	7	8
	道 路 給 水 管		106	△ 33	139	103	143	152
	宅 地 内 給 水 管		94	20	74	62	69	94
	計		205	△ 11	216	173	219	254
漏 水 防 止 推 定 水 量 (m <sup>3</sup> /日)	道 路 配 水 管		188	128	60	434	449	151
	道 路 給 水 管		1,414	△ 407	1,821	1,396	1,953	2,058
	宅 地 内 給 水 管		966	140	826	806	714	1,074
	計		2,568	△ 139	2,707	2,636	3,116	3,283
戸 別 調 査 件 数 (件)			133,877	△ 4,646	138,523	131,405	144,094	187,523

